




Исх. № 452 от «15» декабря 2010 г.

Коммерческое предложение

Настоящим сообщаем, что ООО «БалтСтройМонтаж» имеет возможность строительства птицефермы. Предлагаем два варианта металлокаркаса:

Вариант №1

Район строительства – III снеговой район

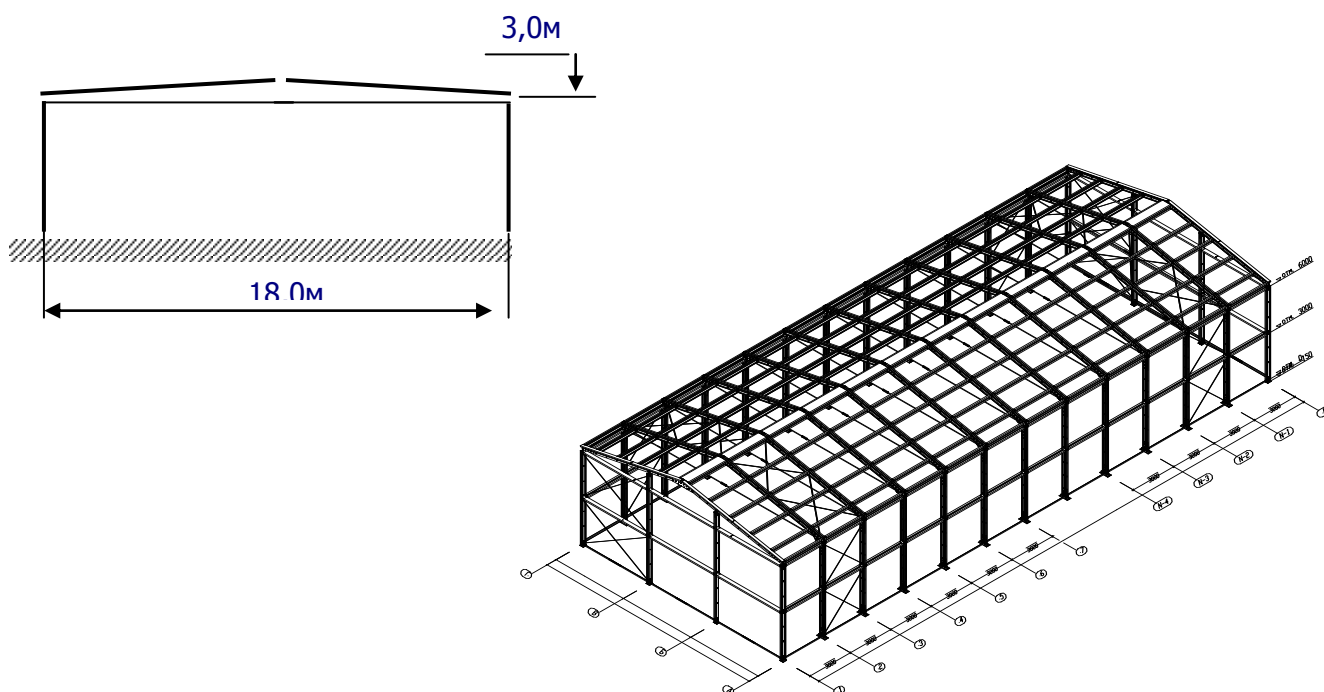

Каркас металлический состоит из Σ -образных и С-образных оцинкованных профилей (Сталь марки С275). Соединения элементов каркаса обеспечиваются унифицированными узлами крепления. В качестве крепежа применяются оцинкованные болты и саморезы.

Жесткость каркаса здания в целом обеспечивается системой распорок, вертикальных и горизонтальных гибких связей.

Стеновые и кровельные прогоны выполнены из холодногнутых С-профилей, изготовленных из оцинкованной стали. Соединение прогонов к каркасным элементам – болтовое.
Фундаменты здания – точечные.

Вариант №2

Район строительства – III снеговой район

Каркас металлический состоит из черного металлопроката , дробеструйная подготовка очистка до St2, обезжиривание до ст. 1, горячее цинкование (Сталь марки С245). Соединения элементов каркаса обеспечиваются унифицированными узлами крепления. В качестве крепежа применяются оцинкованные болты и саморезы.

**Расценки на строительно- монтажные работы
на 1 кв.м по полу**

№ п./п.	Наименование работ	Вариант №1 руб/кв.м по полу	Вариант №2 руб/кв.м по полу
2	Устройство фундаментов, м3	900	900
3	Устройство шлифованной плиты пола t=300мм, полы ЖБ с двойным армированием, утеплением и обеспыливающим упрочняющим покрытием «Мастер Топ»: кв.м.	2000	2000
4	Изготовление м/конструкций, Включая стоимость закупаемого м/проката.	1550	2625
	Доставка		
	Монтаж металлоконструкций	420	360
	Кровля (сэндвич панель ППУ) 100мм Из расчета расхода 1,1 кв.м кровли на 1 кв.м пола	1326	1326
	Стены (сэндвич панель ППУ) 80мм Из расчета расхода 0,51 кв.м стен на 1 кв.м пола	505	505
	Фасонные элементы и крепления	140	140
	Монтаж стеновых и кровельных панелей и фасонных элементов Из расчета расхода 1,61 кв.м стен на 1 кв.м пола	325	325
Всего:		7 136,00	8 181,00

С уважением,

Финансовый директор
ООО «БСМ»
e-mail: bcs_group@inbox.ru
www.bcsmontage.com

Шишков И. А.

Руководитель _____ Кузькина Е. В.



Юридический адрес: 188306, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Урицкого, дом 96
р/счет 40702810001010102533 в ОАО «РУСКОБАНК» г. Всеволожск кор/ счет 30101810200000000725
БИК 044106725, ОГРН 1074705004890, **ИНН 4705039646**, **КПП 470501001**, bcs_group@inbox.ru
